


SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE - FASI DI DISGAGGIO

1 FASE DI LAVORO: DISGAGGIO DI SICUREZZA







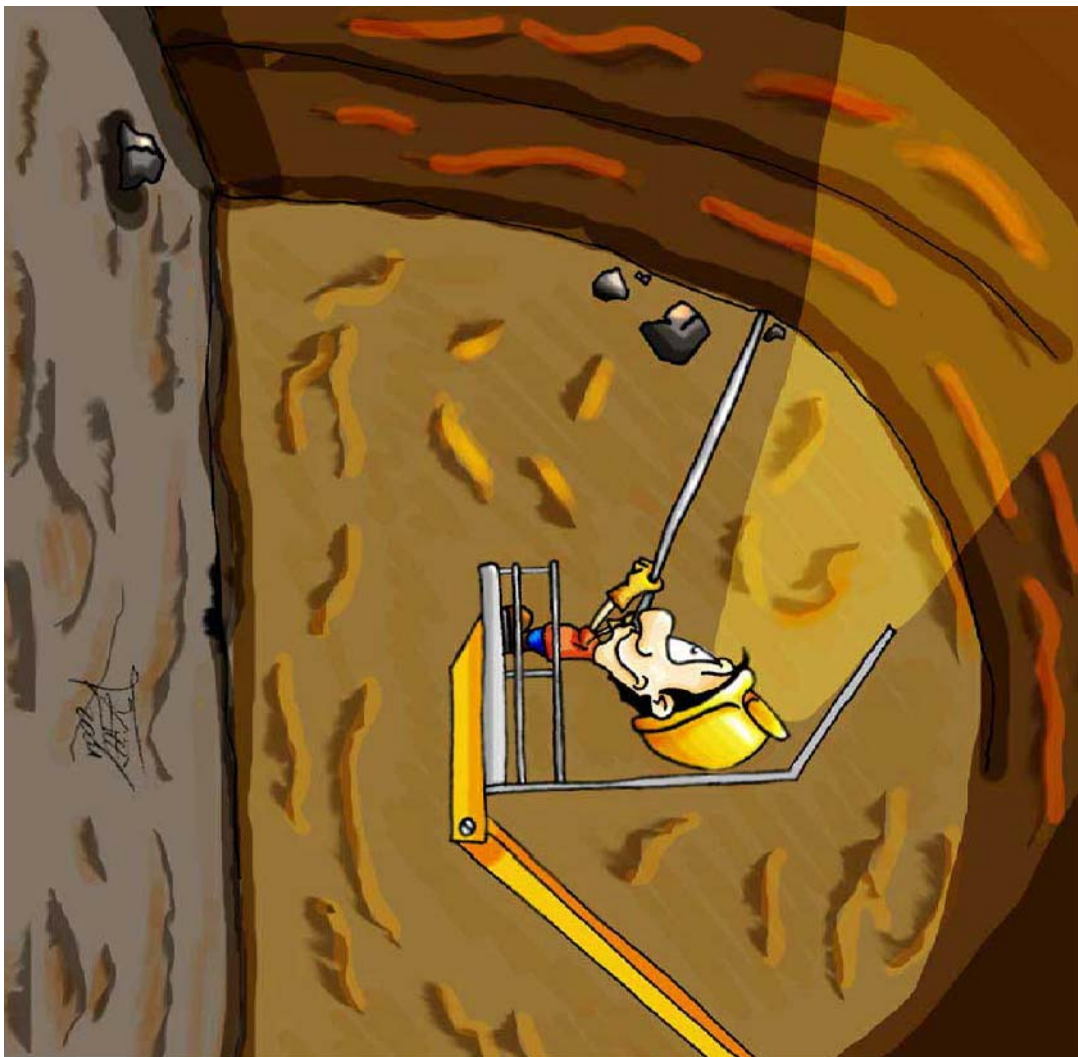


- RISCHI:**
- INVESTIMENTO DA BLOCCHI ROCCIOSI
  - CADUTA DALL'ALTO
  - INVESTIMENTO DA MACCHINE OPERATRICI
  - POLVERI E FIBRE

- MISURE DI PREVENZIONE:**
- IMPREGARE IDONEI GESTILI O PIATTAFORME
  - NON SOTTOSTARE MAI ALLA ZONA DI LAVORO DI ALTRE PERSONE
  - OPERARE DA UNA ZONA GIÀ PREINVESTITA
  - LA ZONA DA DISGAGGIARE DEVE ESSERE BEN ILLUMINATA


Dopo lo sparo della volata va sempre eseguito il disgaggio delle porzioni rocciose instabili

Ricordati che il disgaggio di sicurezza va eseguito dai minatori più esperti e sotto la guida del capo imbocco

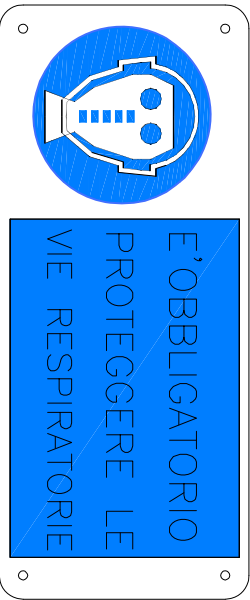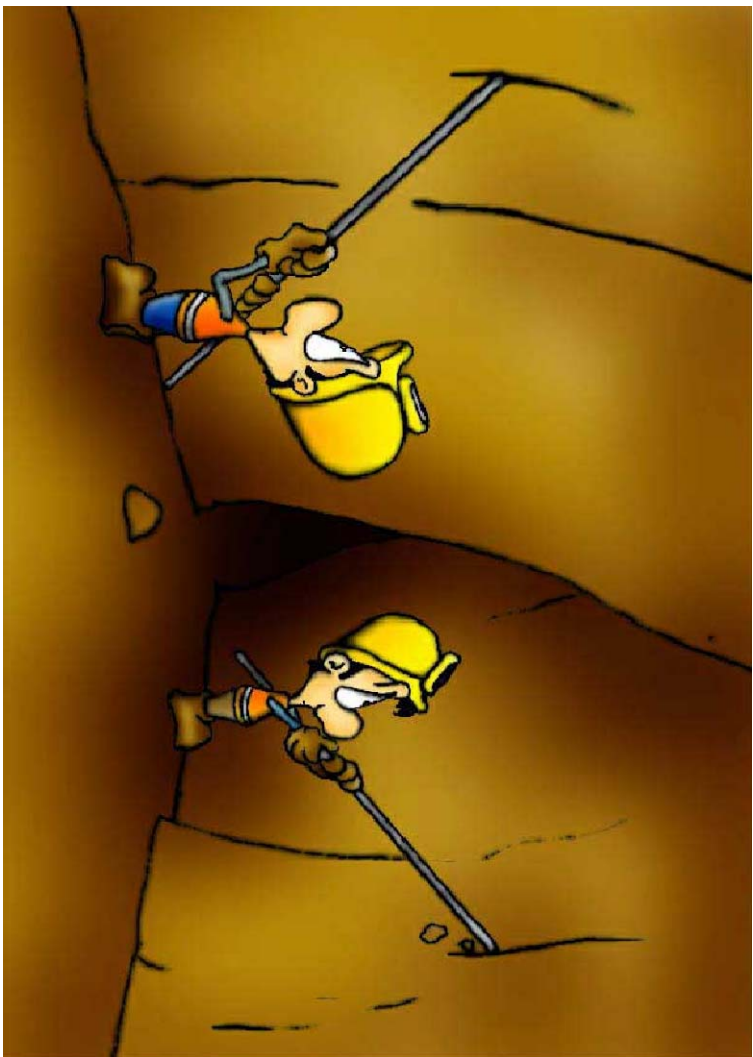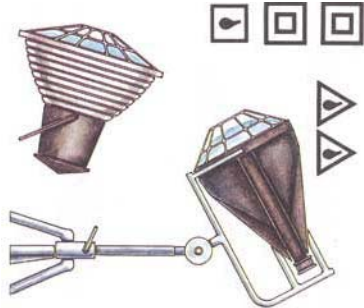

2 FASE DI LAVORO: DISGAGGIO CON MARTELLONE


- RISCHI:**
- RUMORE
  - POLVERI
  - INVESTIMENTO DI BLOCCHI ROCCIOSI
  - INVESTIMENTO DA MACCHINE OPERATRICI

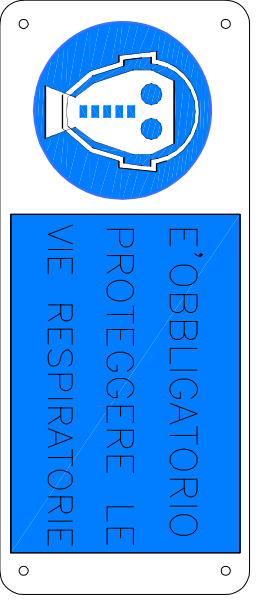

- MISURE DI PREVENZIONE:**
- MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA
  - LO SMARINO PRIMA DI ESSERE CARICATO SUI DUMPERS DEVE ESSERE INUMIDITO CON IDONEI INFIATTORI D'ACQUA
  - INDOSSARE I D.P.I., PRESCRITTI ED IN PARTICOLARE IL RUMORE ANTIPOLVERE E LA CUFFIA ANTIRUMORE




Inumidazione del materiale di scavo da rimuovere e trasportare durante le fasi di lavoro relative al disgaggio ed allo smarino

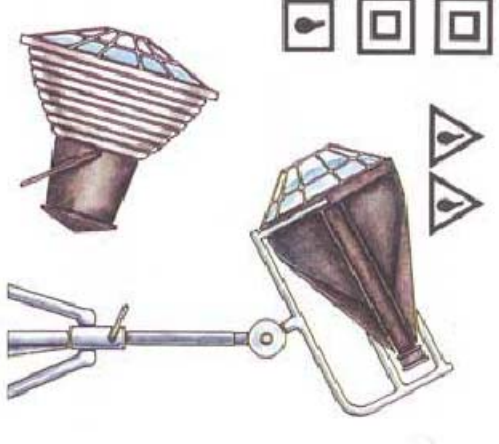


- RISCHI:**
- RUMORE
  - POLVERI
  - INVESTIMENTO DI BLOCCHI ROCCIOSI
  - INVESTIMENTO DA MACCHINE OPERATRICI

- MISURE DI PREVENZIONE:**
- BAGNARE IL MATERIALE
  - INDOSSARE LE CUFFIE ANTIRUMORE
  - L'ESCAVATORE CON MARTELLONE DEVE ESSERE MUNITO DI PROTEZIONE DELLA CABINA
  - NON SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'ESCAVATORE




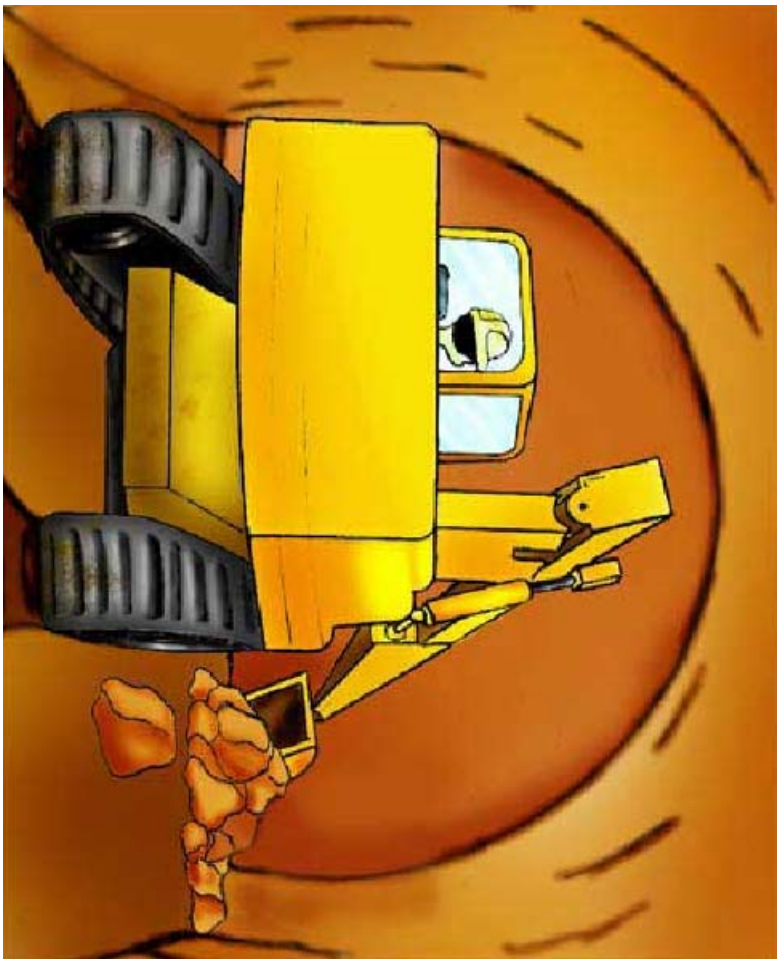


- RISCHI:**
- INVESTIMENTO DA MACCHINE OPERATRICI
  - URTO DAL MOVIMENTO DELLA BENNA



- MISURE DI PREVENZIONE:**
- E' VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE





Gli addetti devono indossare le cuffie antirumore durante le lavorazioni che superano lo soglia degli 85 db



Comune di Verbania  
PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO  
DELLE OPERE DI "VARIANTE ALL'ABITATO DI VERBANIA"  
DELLA S.S. N.34 - 1° LOTTO



PARTE GENERALE  
PSC - ELABORATI GRAFICI  
GALLERIA NATURALE - DISGAGGIO

Mandatara:		Mandanti:		IL RESPONSABILE E L'ADDEBITRICE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :		IL GEOLOGO :	
							
SOT		Dot. Ing. Alberto Cicciati		Dot. Ing. G.S. Kalamanas		Dot. Carlo Alessio	
IL PRODOTTO :		IL RESPONSABILE :		IL RESPONSABILE E L'ADDEBITRICE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :		IL GEOLOGO :	
				Dot. Ing. A. Salvaggio de Gennaro		Dot. Carlo Alessio	
COMMESSA		FASE		DOCUMENTO		FILE	
B3517		P.D.		W00RC0111		GPRW0RC01110.DWG	
REV		COMPARTO		REV		SCALA	
0		GPR		0		VARIE	
30/05/2012							
PRIMA EMISSIONE							
DESCRIZIONE							
