SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE - POSA CENTINE METALLICHE

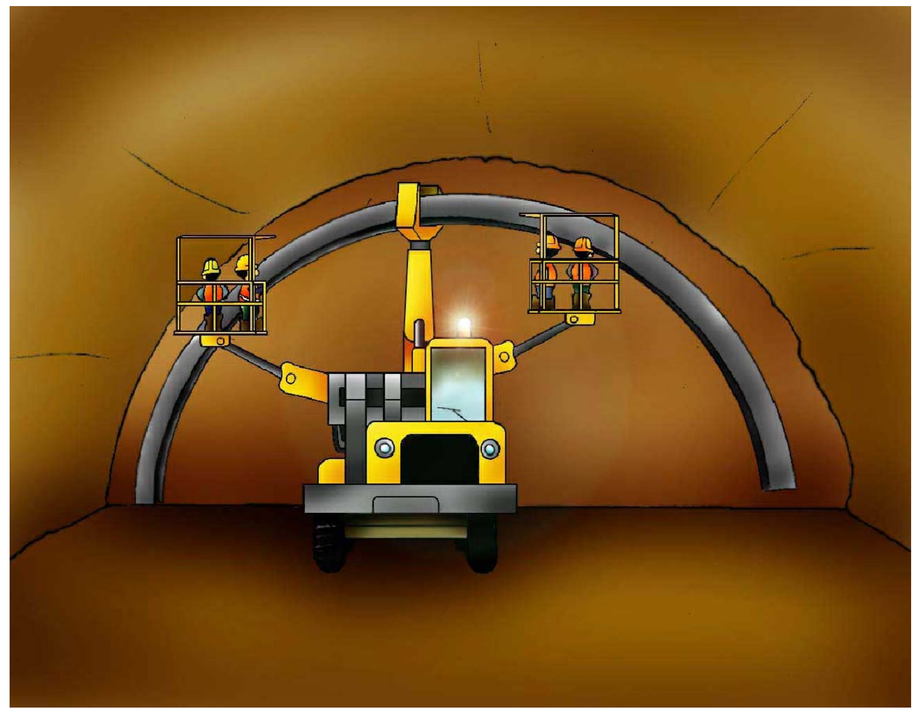

RISCHI :
- CADUTA DALL'ALTO
- INVESTIMENTO DA CADUTA E/O PROIEZIONI DI MATERIALE
- ABRASIONI E CONTUSIONI
- SCHIACCIAMENTO

LA MACCHINA POSACENTINE DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ADEGUATAMENTE ISTRUITO ED ADDESTRATO. PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA CENTINA E' NECESSARIO CHE QUESTA SIA FATTA ADERIRE PER QUANTO POSSIBILE AL PROFILO DELLO SCAVO. DURANTE LE VARIE MANOVRE L'OPERATORE DOVRA' ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE D'USO FORNITO DAL COSTRUTTORE E DOVRA' VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

MISURE DI PREVENZIONE :
- UTILIZZARE APPOSITE MACCHINE ADIBITE AL SOLLEVAMENTO E ALLA MESSA IN OPERA DELLE CENTINE (POSACENTINE) CON CESTELLI PORTAPERSONE
- LA MACCHINA POSACENTINE IN QUANTO MEZZO DI SOLLEVAMENTO DEVE ESSERE VERIFICATA ANNUALMENTE
- ASSICURARSI CHE IL MEZZO SIA OMOLOGATO
- PRIMA DI PROCEDERE ALLA POSA DELLA CENTINA VERIFICARE LA STABILITA' DELLE PARETI DI SCAVO E DEL FRONTE
- ASSICURARSI DEL CORRETTO BLOCCAGGIO DELLA CENTINA
- MANTENERSI A DISTANZA DI SICUREZZA E/O A VISTA DELL'OPERATORE
- ILLUMINARE ADEGUATAMENTE L'AREA DI LAVORO
- IMPIEGARE LA MACCHINA POSA CENTINE SU STABILIZZATORI



NELLO SCAVO DI GALLERIE CHE RICHIEDONO L'USO DI CENTINE E' NECESSARIO CHE QUESTE SIANO COLLOCATE IN OPERA DI PARI PASSO CON L'AVANZAMENTO (POSSIBILMENTE UNA ALLA VOLTA) ED IL PIU' VICINO POSSIBILE AL FRONTE DI SCAVO

Gli addetti devono indossare le cuffie antirumore durante le lavorazioni che superano la soglia degli 85 db

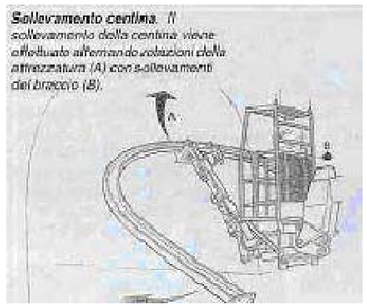

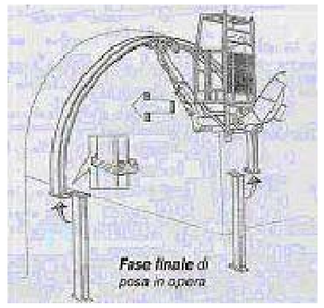

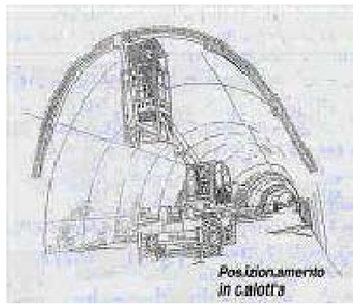



SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE - ESECUZIONE SPRITZ BETON

RISCHI :
- POLVERI E FIBRE
- CADUTA DALL'ALTO DEL MATERIALE PROIETTATO
- DISTACCO DI PORZIONI ROCCIOSE
- RUMORE
- GETTI, SCHIZZI
- ALLERGENI

MISURE DI PREVENZIONE :
- LAVORARE STANDO SOTTO LE ZONE GIA' CONSOLIDATE
- INDOSSARE LE CUFFIE ANTIRUMORE
- INDOSSARE LE MASCHERINE ANTIPOLVERE
- IL MACCHINARIO DI POSA DEVE ESSERE AZIONATO SOLO DA OPERATORI ESPERTI O DA APPRENDISTI CHE AGISCANO SOTTO LA GUIDA DELL'OPERATORE QUALIFICATO E CHE DEVONO COMUNQUE ENTRAMBI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO DEL MANUALE D'USO FORNITO DAL FABBRICANTE DELLA MACCHINA.

- PRESSO LA DIREZIONE DI CANTIERE DOVRA' ESSERE SEMPRE DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RIGUARDANTE L'ACCELERANTE DI PRESA IMPIEGATO E GLI ADDETTI ALLA POSA DELLO SPRITZ BETON SARANNO ADEGUATAMENTE ISTRUITI SULLA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO.



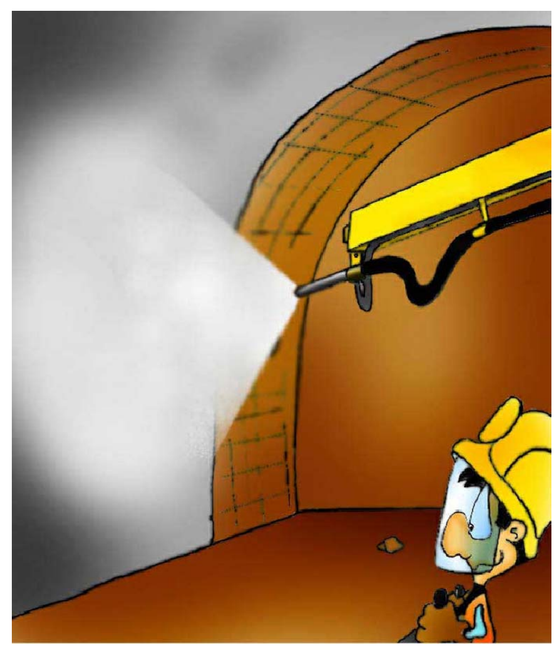

Comune di Verbania

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO DELLE OPERE DI "VARIANTE ALL'ABITATO DI VERBANIA" DELLA S.S. N.34 - 1° LOTTO

PARTE GENERALE
PSC - ELABORATI GRAFICI
GALLERIA NATURALE - POSA CENTINE E SPRITZ

Mandataria:	Mandanti:		
SYSTRA SYS TRA SOTECNI	AK	MSM INGEGNERIA	ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE ALESSIO Carlo
IL PROGETTISTA : Dott. Ing. Alberto Checchi	IL RESPONSABILE : Dott. Ing. G.S. Kalamaras	IL RESPONSABILE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE : Dott. Ing. A. Salvago de Gennaro	IL GEOLOGO : Dott. Carlo Alessio

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	FILE
B357	PD	GPR	VV00RG0113	0	VARIE	GPRVV00RG01130.DWG

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
3						
2						
1						
0	30/05/2012	PRIMA EMISSIONE	M. COIA	L. MELICA	A. SALVAGO	A. CHECCHI
